

ΘΕΜΑ 1^ο: Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-27**Α.ΕΓΚΡΙΣΗ Προγράμματος ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ**

Το ΠεΠ «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 εγκρίθηκε στις 5/9/2022 με την αριθμ. C(2022) 6508 final απόφαση της Ε.Ε. . Η 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος εγκρίθηκε με την αριθμ. C(2026)1428/4-3-2026 και δομείται πλέον στις παρακάτω Προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού **(29,54 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής **(48,64 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας **(0,00 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 2Β: Προστασία των Υδάτων **(14,35 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 2Γ: Προσιτή στέγαση **(14,40 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών **(23,13 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών **(36,62 εκατ.€)**


Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+): Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού **(72,96 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης **(42,61 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ **(1,54 εκατ.€)**

Προτεραιότητα 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ **(3,79 εκατ.€)**

Συνολικά, οι πόροι του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 διαμορφώνονται σε:

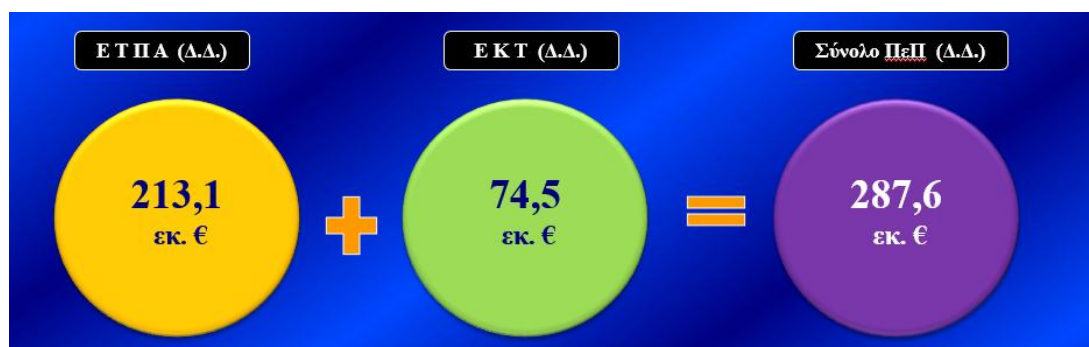

Το 85% των πόρων αποτελεί Κοινοτική Συνδρομή και το υπόλοιπο 15% την Εθνική Συμμετοχή.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ 2021-2027¹

Ο χρονο-προγραμματισμός Προσκλήσεων, η εξειδίκευση Δράσεων και η έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων αποτελούν τα αναγκαία στάδια που προηγούνται της έκδοσης Προσκλήσεων και της Ένταξης πράξεων.

Με τον ετήσιο Προγραμματισμό Προσκλήσεων προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες για την ενεργοποίηση της υλοποίησης του ΠεΠ για τα έτη 2023-2026. Σύμφωνα με αυτές, στο αρχικό στάδιο ενεργοποίησης του Προγράμματος, η ΕΥΔ εστιάζει στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση δράσεων που αφορούν κυρίως:

- σε **τμηματοποιημένα έργα και σε έργα που έχουν ωριμάσει/ξεκινήσει** κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,
- σε **δράσεις κοινωνικών δομών η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε** κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχίζεται.
- σε δράσεις που συνδέονταν με **ορόσημα για το 2024**
- σε δράσεις που **διαθέτουν ωριμότητα**, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από αναγκαίους όρους ή δεσμεύσεις.

Β.1. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ- ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η κατηγορία των τμηματοποιημένων έργων («phasing projects») και των πράξεων που ωρίμασαν κατά την π.π. 2014-2020 και υλοποιούνται πλέον στο πλαίσιο του ΠεΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 - ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΕ 2021-2027 σε εκ €

ΠεΠ 2021-2027	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ PHASING		ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ		ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ		Σύνολο	
Π-1	0	0	3	0,72	0	0,0	3	0,72
Π-2	4	3,81	10	9,87	0	0,0	14	13,68
Π-3	0	0	3	41,76 ²	0	0,0	3	41,76
Π4Α-ΕΤΠΑ	2	3,46	16	24,96	0	0,0 ³	18	28,42
Π4Β-ΕΚΤ	0	0	3	5,25	0	0,0	3	5,25
Π-5	3	9,67	2	7,60	0	0,0	5	17,27
Π-6	0	0	0	0	0	0	0	0
Π-7	0	0	0	0	1	1,0	1	1,0
Σύνολο ΠεΠ	9	16,94	37	90,16	1	1,0 ⁴	47	108,1

¹ Τα στοιχεία της εισήγησης έχουν αντληθεί από το ΟΠΣ στις 18/5/2026

² Εκ των οποίων: οδός «3Γεφύρια-Βρυώνη (ΚΕΡΚ) με ~27,9εκ€ και οδός «Αεροδρόμιο-Κρανιά» (ΚΕΦΑΛ) με ~7,9 εκ€.

³ Το Αχίλλειο (β' φάση) προβλέπεται να ολοκληρωθεί κυρίως με ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ.

⁴ Πρόκειται για την πράξη που αφορά στην Υποστήριξη Δικαιούχων από τη ΜΟΑ ΑΕ

Με βάση το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται «μετάπτωση» **47** πράξεων συνολικής υπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης **108,1 εκατ.€**. Πρόκειται για “τμηματοποιημένες” πράξεις και “μεταφερόμενες” πράξεις της π.π. 2014-2020 (ωρίμασαν ή/και ξεκίνησε η υλοποίησή τους με δαπάνες μετά το 2021 και θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου την π.π. 2021-2027).

-Για την υπολειπόμενη προς μεταφορά, 1 πράξη, έχει εκδοθεί Πρόσκληση και αναμένεται έως 7/2026 (το αργότερο) η υποβολή και αξιολόγηση/ένταξη.

Β.2.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η ΕΥΔ από τον 11/2022 έως σήμερα, προχωράει διαδοχικά στην εξειδίκευση και στην έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης για μια σειρά δράσεων του Προγράμματος.

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συγκεντρωτική αποτύπωση της πορείας της Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2021-2027								
Προτεραιότητα	Ταμείο	Π/Υ Δ.Δ. στο ΠΕΠ (εκατ.€)	Δράσεις με εξειδίκευση (5/26)	Π/Υ Δ.Δ. που εξειδικεύτηκε (εκ€) (04/26)	% Εξειδίκευσης (04/26)	Δράσεις με & προς εξειδίκευση (06/26)	Π/Υ Δ.Δ. με & προς εξειδ (εκ€) (06/26)	% Εξειδίκευσης (06/26)
Π-1	ΕΤΠΑ	29,54	7	11,9	40,4	13	43,7	147,9
Π-2	ΕΤΠΑ	48,64	8	42,2	86,7	16	68,1	140,0
Π-2Β	ΕΤΠΑ	14,35	0	0	0	1	15,0	104,5
Π-2Γ	ΕΤΠΑ	14,4	0	0	0	2	14,4	100,0
Π-3	ΕΤΠΑ	23,13	4	25,5	110,2	5	27,5	118,9
Π-4Α	ΕΤΠΑ	36,62	8	65,6	179,2	13	86,6	236,5
Π-4Β	ΕΚΤ+	72,96	29	74,8	102,5	30	76,8	105,3
Π-5	ΕΤΠΑ	42,61	4	42,3	99,3	7	53,2	124,9
Π-6	ΕΚΤ+	1,54	1	1,5	100	1	1,5	97,4
Π-7	ΕΤΠΑ	3,8	1	4,2	110,5	1	4,2	110,5
	Σύνολο ΕΤΠΑ	213,1	32	191,7	90,0	58	312,7	146,7
	Σύνολο ΕΚΤ+	74,5	30	76,3	102,4	31	78,3	105,1
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ		287,6	62	268,1	93,2	89	391,00	136,0

-**έχουν εξειδικευτεί** συνολικά 62 Δράσεις, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 268,1 εκατ.€ που αντιστοιχούν στο **93,2%** των πόρων του Προγράμματος. Από αυτές, οι 32 αναφέρονται στο ΕΤΠΑ με συνολικό Π/Υ 191,7 εκατ.€ (**90,0% του ΕΤΠΑ**) και οι υπόλοιπες 30 στο ΕΚΤ με συνολικό Π/Υ 76,3 εκατ.€ (**102,4% του ΕΚΤ**).

-έως τον 6/2026 θα έχουν εξειδικευτεί **σωρευτικά 89 Δράσεις, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 391,0 εκατ.€ που αντιστοιχούν στο 136,03% των πόρων του Προγράμματος** (146,7% του ΕΤΠΑ και 105,1% του ΕΚΤ)

Β.3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΝΤΑΞΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Η γενική εικόνα της υλοποίησης του ΠεΠ «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 18/5/2026, υποδηλώνει την παρακάτω πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησής του.

Το ύψος των **προσκήσεων** για την υποβολή προτάσεων ανήλθε στα **299,4 εκατ. €**. (ποσοστό **104,1%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος) και σε **66** Προσκήσεις.

Έως 12/2026, οι Προσκήσεις αναμένεται να ανέλθουν στα 412,0 εκ€ (143,3%) του Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός των **ενταγμένων** πράξεων (**112 πράξεις**) ανήλθε στο ποσό των **205,3 εκατ. €** σε Δ.Δ. το οποίο αποτελεί το **71,4%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος, ενώ **οι νομικές δεσμεύσεις** που είχαν αναληφθεί ανήλθαν στο ποσό των **93,9 εκατ. €**, το οποίο αποτελεί το **32,7%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. Οι δε καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ (αποδεκτό διαχείρισης) ανήλθαν στο ποσό των **50,8 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης **17,7 %** των συνολικών πόρων ΠΕΠ ΙΝ 2021-2027.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 (Στοιχεία 18/05/2026)									
ΚΩΔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης στο ΠεΠ	Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης Δράσης που εξειδικεύτηκε	ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΩΝ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	MIS	ΜΕΤΑΦΕΡ ΟΜΕΝΟ / PHASING	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -1-	29.535.380,0	11.925.000,0	7	6.600.000,0	6	3	2.301.823,4	1.043.888,3	120.502,8
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2-	48.640.819,0	42.153.445,0	9	61.155.000,0	17	14	18.980.999,1	9.020.307,2	6.392.193,7
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2Β-	14.352.819,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2Γ-	14.406.631,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -3-	23.128.446,0	25.500.000,0	3	25.500.000,0	4	3	43.974.013,7	4.752.647,6	36.687,0
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -4Α-	36.616.485,0	65.632.730,0	10	69.992.730,0	20	18	42.817.546,3	19.614.748,8	11.547.615,8
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -4Β-	72.963.606,0	74.795.121,5	32	72.136.611,5	48	3	53.142.217,0	51.346.400,8	30.449.492,1
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -5-	42.611.009,0	42.312.000,0	3	58.312.000,0	11	5	40.419.992,1	6.842.242,7	1.784.214,7
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -6-	1.543.842,0	1.543.842,0	1	1.543.842,0	1	0	500.000,0	47.740,0	10.912,0
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -7-	3.795.444,0	4.195.444,0	1	4.195.444,0	5	0	3.206.444,0	1.253.608,0	440.746,3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	213.087.033,0	191.718.619	33	225.755.174	63	43	151.700.819	42.527.443	20.321.960
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+	74.507.448,0	76.338.963,5	33	73.680.453,5	49	3	53.642.217,0	51.394.140,8	30.460.404,1
ΣΥΝΟΛΟ ΠεΠ 2021-	287.594.481,0	268.057.582,5	66	299.435.627,5	112	46	205.343.035,6	93.921.583,4	50.782.364,4
Ενεργοποίηση ΕΤΠΑ		90,0		105,9			71,2	20,0	9,5
Ενεργοποίηση ΕΚΤ+		102,5		98,9			72,0	69,0	40,9
Ενεργοποίηση ΠεΠ		93,2%		104,1%			71,4%	32,7%	17,7%

Αξίζει δε, να σημειωθεί ότι:

-η ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+) η ενεργοποίηση του ΠεΠ διαφοροποιείται:

Το ΕΤΠΑ (λόγω και του συνολικού μεριδίου του στο ΠεΠ ~74,0%) «υπερέχει» σε εξειδίκευση, Προσκήσεις και Εντάξεις (σε απόλυτα μεγέθη), ΑΛΛΑ **«υστερεί»** σε Νομικές Δεσμεύσεις και Πληρωμές (παρά το συνολικό του μερίδιο στο ΠεΠ).

-η «**συνεισφορά**» από τα 46 «phasing» και «μεταφερόμενα» έργα (που έχουν έως σήμερα ενταχθεί), εκ των οποίων τα 43 αφορούν στο ΕΤΠΑ:

- συνολικός π/υ ένταξης (Δ.Δ.) 107,1 εκ.€ (συμβάλουν κατά 52,2% στις συνολικές εντάξεις),
- Νομικές Δεσμεύσεις 43,3 εκ.€ (συμβάλουν κατά 46,1% στις συνολικές ΝΔ),
- Δαπάνες 20,7 εκ.€ (συμβάλουν κατά 40,7% στις συνολικές Δαπάνες)

-οι ρυθμοί (%) ενεργοποίησης ευνοούν το ΕΚΤ+ έναντι του ΕΤΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά στις νομικές δεσμεύσεις (3,5:1,0) και τις πληρωμές (4,3:1,0).



-το μεγαλύτερο «**κενό**»/υστέρηση παρατηρείται μεταξύ εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων.

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Γ.1.Περιφερειακή διάσταση RIS/3:

- (επανα) Συγκρότηση και λειτουργία ΠΣΕΚ:
Το ΠΣΕΚ συγκροτήθηκε εκ νέου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2023. Απαρτίζεται από 11 μέλη, τα 6 προερχόμενα από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τα 5 από επαγγελματικούς, αυτοδιοικητους, επιστημονικούς φορείς.
- Επικαιροποίηση περιφερειακής διάστασης RIS:
Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2021. Οι τομείς προτεραιότητας της νέας περιόδου 2021-2027, είναι:
“Γαλάζια οικονομία”,
“Πολιτιστικό-Τουριστικό σύμπλεγμα”,
“Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα”,
καθώς και οι «οριζόντιου χαρακτήρα» τομείς “Ανάπτυξη Ικανοτήτων στο Περιφερειακό σύστημα Καινοτομίας”, “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”, “Αειφορία και Κυκλική Οικονομία”.
- «Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»(ΔΕΑ):
ο 1^{ος} κύκλος ΔΕΑ πραγματοποιήθηκε το α’ 6μηνο του 2023 με εστίαση στον «βιώσιμο τουρισμό», με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης (03/2024),
ενώ
ο 2^{ος} κύκλος ΔΕΑ εξελίχθηκε εντός του α’ 6μήνου του 2025 με εστίαση σε όλους τους βασικούς τομείς (υπηρεσίες & προϊόντα) υπό την επιστημονική εποπτεία του ΠΣΕΚ

Π.Ι.Ν. Στο ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης 10 εργαστηρίων απεστάλησαν συνολικά **638 Προσκλήσεις⁵** σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις/παραγωγούς, με τελικούς συμμετέχοντες:

Θεματικός Τομέας	Αριθμός Εργαστηρίων	Συμμετέχοντες				
		Σύνολο ατόμων	Ερευνητικά – ΑΕΙ (ΝΠ)	Επιχειρήσεις (ΝΠ)	Δημόσιοι Φορείς	Κοινωνία Πολιτών (φορείς)
Αγροδιατροφή	5	100	2	29	8	5
Τουρισμός - Πολιτισμός	4	57	1	11	11	3
Κυκλική Οικονομία	1	29	1	7	6	3
ΣΥΝΟΛΟ	10	186	4	47	25	11

Τον 11/2025 σε συνεργασία με την κεντρική Μονάδα ΕΣΕΕ, οριστικοποιήθηκαν οι αναλυτικές προτεραιότητες της Π.Ι.Ν. στους παραπάνω τομείς.

- Με βάση τις παραπάνω προτεραιότητες, έως το τέλος του 2026, **σχεδιάζονται νέες Προσκλήσεις** έρευνας⁶, συμπράξεων⁷ και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας⁸, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη εισήγηση

- Δημιουργία Δομής Καινοτομίας

Για να ενισχυθεί ο Φ.Δ.Π.(ΔΙΑΠ ΠΙΝ), τον 9/2023 εντάχθηκε στο ΠεΠ η δημιουργία Δομής για την υποστήριξη του συστήματος Καινοτομίας της ΠΙΝ, Με σημαντική καθυστέρηση και κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού από ΠΙΝ, τον 4/2026 υπεγράφη η σχετική σύμβαση με ανάδοχο.

Γ.2. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη:

1. Προβλεπόμενες Χωρικές Στρατηγικές στο ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027

Το Πρόγραμμα «**Ιόνια Νησιά**» 2021-2027 αξιοποιεί τα χωρικά εργαλεία (ΟΧΕ & ΒΑΑ), προβλέποντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη:

- ❖ της **παράκτιας ζώνης** της Περιφέρειας (ΟΧΕ) με εστίαση στον βιώσιμο τουρισμό και
- ❖ **2 αστικών κέντρων-πρωτευουσών** νομών της (ΒΑΑ) με εστίαση στη βιωσιμότητα, αειφορία και ανθεκτικότητα και τις αρχές του Ν.Ε.Β. Η μία εκ των -2- ΒΑΑ αφορά στην ήδη υλοποιούμενη από την π.π. 2014-2020, στρατηγική της πόλης Κέρκυρας

⁵ Αγροδιατροφή (συνολικά 308), Τουρισμός (151, αλλά μέσω των Τουριστικών Φορέων των νησιών ενημερώθηκε το σύνολο των επιχειρήσεων-μελών τους), ΔΠΟ (82) και Κυκλική Οικονομία (97)

⁶ Σχεδιάζεται η έκδοση 1 νέας Πρόσκλησης για δράσεις έρευνας σε τομείς RIS

⁷ Έχει ήδη εκδοθεί η Πρόσκληση ION67 με 4,0 εκ.€

⁸ Σχεδιάζεται η έκδοση 4 Προσκλήσεων εντός του 2026 συνολικού π/υ 30,0 εκ.€

Οι παραπάνω Στρατηγικές ενισχύονται κυρίως από την Προτεραιότητα -5- του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027.

2. Πορεία υλοποίησης ΟΧΕ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ...

2.1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΣΒΑΑΚ)

Κατόπιν διαδικασίας ευρείας **ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**⁹ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 452/4-3-2024 απόφαση Περιφερειάρχη η επικαιροποίηση της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑΚ) για την Ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Δημιουργικού και Βιώσιμου Προορισμού», με χρηματοδότηση μέσω του ΠεΠ ύψους 39,5 εκατ€.

Στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων έχουν ενταχθεί έως σήμερα **15 πράξεις (~47,9 εκατ€)**, ενώ σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται 2 ακόμη πράξεις (~2,3 εκ.€). Παράλληλα η ΟΣΒΑΑΚ «συμμετέχει» σε σχεδιαζόμενες «οριζόντιες» δράσεις «επιχειρηματικότητας» και «κοινωνικής οικονομίας»

2.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Από τον 3/2024 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ δύο (2) Προσκλήσεις για την υποβολή:

- προτάσεων νέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)¹⁰, καθώς και
- πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΣΟΧΕ)

Στο πλαίσιο αυτών εγκρίθηκε πρόσφατα (4/2026):

- η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Λευκάδας 2021-2027, με χρηματοδότηση μέσω του ΠεΠ ύψους ~18,0¹¹ εκατ€. **Εντός του 2026 προβλέπεται η έκδοση σχετικής Πρόσκλησης.**

ενώ ενεργοποιήθηκε πρόσφατα η εκπόνηση της ΟΧΕ για τον παράκτιο χώρο της ΠΙΝ, με συμβολή και της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.

Γ.3. Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού:

⁹ Πραγματοποιήθηκαν 2 ημερίδες, ενώ λειτούργησαν 4 πλατφόρμες διαλόγου με συμμετοχή 30 τοπικών φορέων σε μια 3μηνης διάρκεια, διαβούλευση

¹⁰ «επιλέξιμες» στην κατηγορία αυτή είναι οι πόλεις **Λευκάδας**, **Αργοστολίου-Ληξουρίου** και **Ζακύνθου**.

¹¹ Επιπλέον, 2 πράξεις της Στρατηγικής είχαν προ-ενταχθεί στην Π4 του Προγράμματος από το 2023

Η Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού Π.Ι.Ν. είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) στην Π.Ι.Ν. Από τον 9/2024 έχει προκύψει το τελικό σχέδιο¹² κειμένου της Στρατηγικής, προς αξιοποίηση από την ΟΧΕ ΠΙΝ κα.

Δ. Έργα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1060 της ΕΕ ως «πράξη στρατηγικής σημασίας» ορίζεται η πράξη η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος και η οποία υπόκειται σε ειδικά μέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας·

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει: την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας (Άρθρο 40 του Κανονισμού).

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027, περιλαμβάνονται οι παρακάτω 3 πράξεις "στρατηγικής σημασίας":

1.ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: -2- και Ειδικός Στόχος RSO2.4.

Τύπος Δράσης 2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα

Με βάση το Πρόγραμμα, προβλέπεται η **Δράση:**

"Έρευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών & ανθρωπογενών κινδύνων στην Π.Ι.Ν.", με έναρξη το 2023 και διάρκεια υλοποίησης 70 μήνες

Στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης (ION39) που εκδόθηκε από 8/8/2025, υποβλήθηκε πρόσφατα (30/4/2026) σχετική Πρόταση π/υ ~7,5 εκ€ από εταιρικό σχήμα 8 Δικαιούχων με επικεφαλής το ΕΛΚΕΘΕ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά.

2.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: -4Α- και Ειδικός Στόχος RSO4.2.

Τύπος Δράσης 4Α.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γ'θμιας εκπαίδευσης

Με βάση το Πρόγραμμα, προβλέπεται η **Πράξη:**

¹² Η εκπόνηση της Στρατηγικής βασίστηκε σε σχετική μελέτη (Παν. Αιγαίου) που ολοκληρώθηκε (5/2024) σε συνέχεια διαδικασιών διαβούλευσης που διοργανώθηκαν σε όλες τις Π.Ε. της ΠΙΝ (αρχές του 2024) με την συμμετοχή τουριστικών φορέων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών και λοιπών πολιτών, καθώς και σε μεγάλη «Έρευνα Κοινής Γνώμης» για το «βιώσιμο τουρισμό στην ΠΙΝ (2/2024 με 2.000 ερωτώμενους).

"Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου" (ειδικός στόχος RSO4.2) με έναρξη το 2021 και διάρκεια υλοποίησης 44 μήνες ("phasing")

Στην εκδοθείσα ΙΟΝ27 Πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 31/08/2024 **δεν υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης της πράξης.**

Η συνέχεια είναι σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη της τροποποίησης της μελέτης του βασικού υπο-έργου με βάση σχετική πρόταση του ΥπΠΟ.

3.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σε ΒΑΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: -5- και Ειδικός Στόχος RSO5.1.

Τύπος Δράσης 5.(i).1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές

Με βάση το Πρόγραμμα, προβλέπεται η **Πράξη:**

"Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας & διαμόρφωση υπαίθριων χώρων" (ειδικός στόχος RSO5.1) με έναρξη το 2025 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες

Ακολουθώντας διαδικασίες Ν.Ε.Β., η πράξη έχει ενταχθεί από 21/8/2025 και βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης το 1^ο υπο-έργο (μελέτες αναβάθμισης του Δ.Θ.)

Ε.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Με βάση την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος Ι.Ν. 2021-2027 (α.π. C(2026)1428/4-3-2026 έγγραφο της Ε.Ε.) δημιουργούνται οι παρακάτω νέες Προτεραιότητες:

Π2Β - Προστασία των Υδάτων (Στόχος Πολιτικής 2 «Πράσινη Ευρώπη»/ ΕΤΠΑ)

Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας και του Ειδικού Στόχου RSO2.5 «Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων κλπ» χρηματοδοτείται:

Τύπος Δράσης 2Β.(ν).1: Έργα ενίσχυσης των υδάτων, μέσω της οποίας επιδιώκεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτων και της ασφαλούς πρόσβασης πολιτών και επισκεπτών της Περιφέρειας σε πόσιμο νερό, καθώς και της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό θα στηριχθούν ενδεικτικά:

- Αναβάθμιση/ εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης.
- Παρακολούθηση/ εντοπισμός διαρροών με αξιοποίηση της τεχνολογίας .
- Δράσεις αφαλάτωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού.
- Nature -based solutions για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (διάβρωση ακτών κλπ).
- Εκπόνηση μελετών/ σχεδίων/ πλάνων ολιστικής προσέγγισης σε επίπεδο Νομού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του νόμου 5037/2023.

Οι επενδύσεις στον τομέα των υδάτων θα βασίζονται σε ένα **ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό** κάθε παρόχου υπηρεσιών ύδατος, που θα αντιμετωπίσει ανάγκες όπως το πόσιμο νερό, τα λύματα, τα όμβρια ύδατα, τη διαχείριση της υλός, την επαναχρησιμοποίηση νερού, την ψηφιοποίηση/έξυπνη μέτρηση/τηλεμετρία, την ενεργειακή απόδοση, την ευαισθητοποίηση του κοινού κ.λπ.

Η Δημόσια Δαπάνη της Π2Β ανέρχεται σε **14,3 εκατ€**.

Η δράση λειτουργεί συμπληρωματικά με την αντίστοιχη της Προτεραιότητας 2.

Π2Γ - Προσιτή στέγαση (Στόχος Πολιτικής 2 «Πράσινη Ευρώπη»/ ΕΤΠΑ)

Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας και του Ειδικού Στόχου RSO2.11 «Πρώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση») χρηματοδοτούνται:

Τύπος Δράσης : Ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων με ήπια Ενεργειακή Αναβάθμιση, μέσω της οποίας επιδιώκεται η ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Η δράση θα αφορά αποκλειστικά σε κλειστά ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον 5 έτη, αποκλειστικά, είτε για ιδιοκατοίκηση ως κύρια κατοικία, είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Η υλοποίηση της δράσης έχει ήδη εκχωρηθεί στην **ΕΥΔ Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»**

Τύπος Δράσης : Ανακαίνιση κτιρίων για να διατεθούν προς μίσθωση σε εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες & σε φοιτητές, μέσω του της οποίας θα στηριχθούν έργα βιώσιμης στέγασης & αύξησης του οικιστικού αποθέματος.

Ειδικότερα, προβλέπεται να ενισχυθεί η ανακαίνιση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης) Δημοτικών/Περιφερειακών ακινήτων, καθώς και ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚχ, για την μετατροπή τους σε κατοικίες (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών εστιών) με σκοπό να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση:

α. σε εργαζόμενους οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν (μόνιμα ή για περιορισμένο χρόνο) σε κρατικές, δημοτικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας & εκπαίδευσης κ.ά. & δεν διαθέτουν ακίνητο στους οικείους Δήμους της ΠΙΝ) και

β. σε φοιτητές ΑΕΙ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Π2Γ ανέρχεται σε **14,4 εκατ€**.

-Εντός του 2026 προβλέπεται η ενεργοποίηση και των 3 παραπάνω τύπων δράσεων (για ύδατα και κατοικία)

Ζ. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον «Κανόνα N+3»

Ο «Κανόνας N+3» τίθεται ουσιαστικά σε ισχύ από το 2025 και σημαίνει ότι οι ετήσιες χρηματοροές του Προγράμματος υλοποιούνται με χρονική υστέρηση 3 ετών.

	σε εκατ.€	
Έτη	Κ.Σ.	Δ.Δ.
2021-'2022	41,2	48,5
2023	42,2	49,6
2024	43,0	50,6
2025	43,8	51,5
2026	36,7	43,2
2027	37,6	44,2
Σύνολο ΠεΠ	244,5	287,6

Τα πρώτα έτη λειτουργεί το σύστημα των «προκαταβολών» που ελαφρύνει σε ένα βαθμό την υποχρέωση, αλλά αργότερα, η απόσβεση των προκαταβολών λειτουργεί αντίστροφα.

Ειδικότερα:

Α. για το 2025 - ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Από αρχής της προγραμματικής περιόδου **έως το τέλος του 2025**, θα έπρεπε να έχουν δηλωθεί συνολικές δαπάνες (περιλαμβανομένων των 8,55 εκατ.€ των προκαταβολών) τουλάχιστον **41,2 εκατ.€** (Κ.Σ.) σύμφωνα με τον Κανόνα N+3. Με βάση τα αιτήματα πληρωμής (έως 31/12/2025) 39,5 + την προκαταβολή 8,55 εκ€, τελικά καλύφθηκαν με δαπάνες **48,0 εκατ.€** (ΚΣ).

Β. για το 2026-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Με βάση το από 30-4-2026 έγγραφο της ΕΕ, από αρχής προγραμματικής περιόδου **έως το τέλος του 2026**, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί συνολικές δαπάνες σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής (περιλαμβανομένων 18,3 εκατ.€ εκ των προκαταβολών) τουλάχιστον **83,3 εκατ.€**.

Από τα αιτήματα πληρωμής (έως 5/2026) προκύπτουν: 43,9 + προκαταβολή 18,3 εκ€ = 62,6 εκατ € (ΚΣ) έως σήμερα.

Επομένως, ο στόχος δαπανών **για το υπόλοιπο του 2026** υπολογίζεται σε 21,1 εκατ.€ σε όρους Κ.Σ. ή **24,8 εκατ.€ Δ.Δ.** Με βάση τις προβλέψεις του Σχεδίου Δράσης (4/2026) εκτιμάται ότι **(υπό προϋποθέσεις)** η Κ.Σ. **μπορεί να καλυφθεί** (με αβεβαιότητα)¹³.

Γ. για το 2027-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Ακόμη και ΕΑΝ ο στόχος δαπανών για το 2026 καλυφθεί στο σύνολό του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, **ο στόχος δαπανών για το 2027 υπολείπεται σημαντικά** με βάση τις έως σήμερα προβλέψεις του Σχεδίου Δράσης.

¹³ Στατιστική πιθανότητα επίτευξης στόχου ~84,0%.

Ανάλογη του 2027, θα είναι η εικόνα των υποχρεώσεων και για τα επόμενα έτη.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και προκειμένου να επιτευχθούν οι «δύσκολοι» στόχοι για το 2026 και 2027, **απαιτούνται και προωθούνται:**

-α. με βάση το **Ειδικό Σχέδιο Δράσης** που έχει εκπονηθεί από το 2025 και επικαιροποιείται διαρκώς από την ΕΥΔ, προωθούνται (εντός του 2026):

- Σημαντική **προώθηση στην εξειδίκευση** και την έκδοση Προσκλήσεων για νέες δράσεις (ιδίως ΕΤΠΑ), έτσι ώστε η μεν εξειδίκευση του προγράμματος να ανέλθει από το 93,2% ➔ 136,0%, οι δε Προσκλήσεις από το 104,1% ➔ 143,3% εντός του 2026.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 (Στοιχεία 18/05/2026)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης στο ΠΕΠ	Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης Δράσης που εξειδικεύεται	Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης Δράσης που εξειδικεύεται 31/12/26	ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 31/12/26	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/26	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΑ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΑ) 31/12/26	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/26
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -1-	29.535.380	11.925.000	43.745.000	7	6.600.000	42.420.000	2.301.823	7.001.823	1.043.888	2.964.884	120.503	520.503
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2-	48.640.819	42.153.445	68.108.445	9	61.155.000	87.110.000	18.980.999	50.906.334	9.020.307	19.279.064	6.392.194	8.771.554
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2Β-	14.352.819	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -2Γ-	14.406.631	0	14.414.000	0	0	14.414.000	0	0	0	0	0	0
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -3-	23.128.446	25.500.000	27.500.000	3	25.500.000	27.500.000	43.974.014	50.474.014	4.752.648	5.052.648	36.687	688.340
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -4Α-	36.616.485	65.632.730	86.632.730	10	69.992.730	90.992.730	42.817.546	56.342.248	19.614.749	46.158.830	11.547.616	23.349.155
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -4Β-	72.963.606	74.795.121	76.795.121	32	72.136.611	74.136.611	53.142.217	62.294.593	51.346.401	56.288.691	30.449.492	38.830.441
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -5-	42.611.009	42.312.000	53.172.000	3	58.312.000	69.172.000	40.419.992	44.054.992	6.842.243	29.662.198	1.784.215	4.563.719
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -6-	1.543.842	1.543.842	1.543.842	1	1.543.842	1.543.842	500.000	500.000	47.740	47.740	10.912	10.912
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ -7-	3.795.444	4.195.444	4.195.444	1	4.195.444	4.195.444	3.206.444	3.206.444	1.253.608	1.253.608	440.746	440.746
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	213.087.033	191.718.619	312.767.619	33	225.755.174	336.390.174	151.700.819	211.985.855	42.527.443	104.371.232	20.321.960	38.334.018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+	74.507.448	76.338.963	78.338.963	33	73.680.453	75.680.453	53.642.217	62.794.593	51.394.141	56.336.431	30.460.404	38.841.353
ΣΥΝΟΛΟ Π.2021-2027	287.594.481	268.057.582	391.106.582	66	299.435.627	412.070.627	205.343.036	274.780.448	93.921.583	160.707.663	50.782.364	77.175.371
% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ		93,2%	136,0%		104,1%	143,3%	71,4%	95,5%	32,7%	55,9%	17,7%	26,8%

- Εντάξεις εντός του 2026 νέων πράξεων στις οποίες περιλαμβάνονται και ορισμένες **πράξεις που μεταφέρονται** από άλλα Προγράμματα (ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας κ.ά.) με σημαντικές υλοποιηθείσες πληρωμές¹⁴, αλλά και εντάξεις νέων υποέργων με γρήγορη απόδοση πληρωμών (έργα προμηθειών)
- Συνέχιση της ενίσχυσης της προσπάθειας των Δικαιούχων για την ωρίμανση πράξεων και Στρατηγικών, τόσο μέσω της **Τεχνικής Βοήθειας** του Προγράμματος, όσο και μέσω της περίληψης σχετικών υπο-έργων στις εντάξεις.
- Εξετάζεται από πλευράς ΕΥΔ (σε συνεννόηση με Ε.Ε. και ΕΥΣΠΕΠ) το ενδεχόμενο αξιοποίησης του μηχανισμού «**Συνεισφορά της Ε.Ε. βάσει χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες**» (**FNLC**) για τις σχεδιαζόμενες δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας κ.ά., προκειμένου κατά το 2027 και μετέπειτα να επισπευσθεί η καταβολή κοινοτικών πόρων (στη βάση της εκπλήρωσης ορόσημων που θα συμφωνηθούν)

-β. με βάση δε, το **Σχέδιο Δράσης Δαπανών**¹⁵, υλοποιείται **συστηματική παρακολούθηση** της υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων, προκειμένου να μειωθεί η χρονική απόσταση από την ένταξη στη νομική δέσμευση και από εκεί στην πιστοποίηση δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται εντατικές και επαναλαμβανόμενες **τεχνικές συναντήσεις** με τους βασικούς Δικαιούχους του

¹⁴ Π.χ. έργο Αχιλλείου, Μουσείο Αργοστολίου, ΚΥ Σάμης κλπ

¹⁵ Έχει ενσωματωθεί στο Ειδικό Σχέδιο Δράσης της ΕΥΔ

Προγράμματος και για τις δράσεις που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του N+3.

Τα παραπάνω αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του 2026 και ιδίως του 2027.

Στην προσπάθεια αυτή, «**κρίσιμα ζητήματα**» αποτελούν:

η έγκαιρη έγκριση αναγκαίων ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος (πέραν δηλαδή του 110% σε επίπεδο Προτεραιότητας και του 105% σε επίπεδο Προγράμματος).

η ισχυρή δέσμευση των Δικαιούχων με αυστηρή προώθηση της υλοποίησης από μέρους τους.

η συνεχής, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ και έντονη προσπάθεια από το σύνολο του «συστήματος» σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος σε συνδυασμό με τη μετάβαση από την απλή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ του Προγράμματος, σε «**επιθετική**» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αυτού.

Κέρκυρα, 3/6/2026

ΜΟΝΑΔΑ Α

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι.Ν.
